


Контроль публічних інвестицій

#7, серпень 2026 р.

brp.org.ua

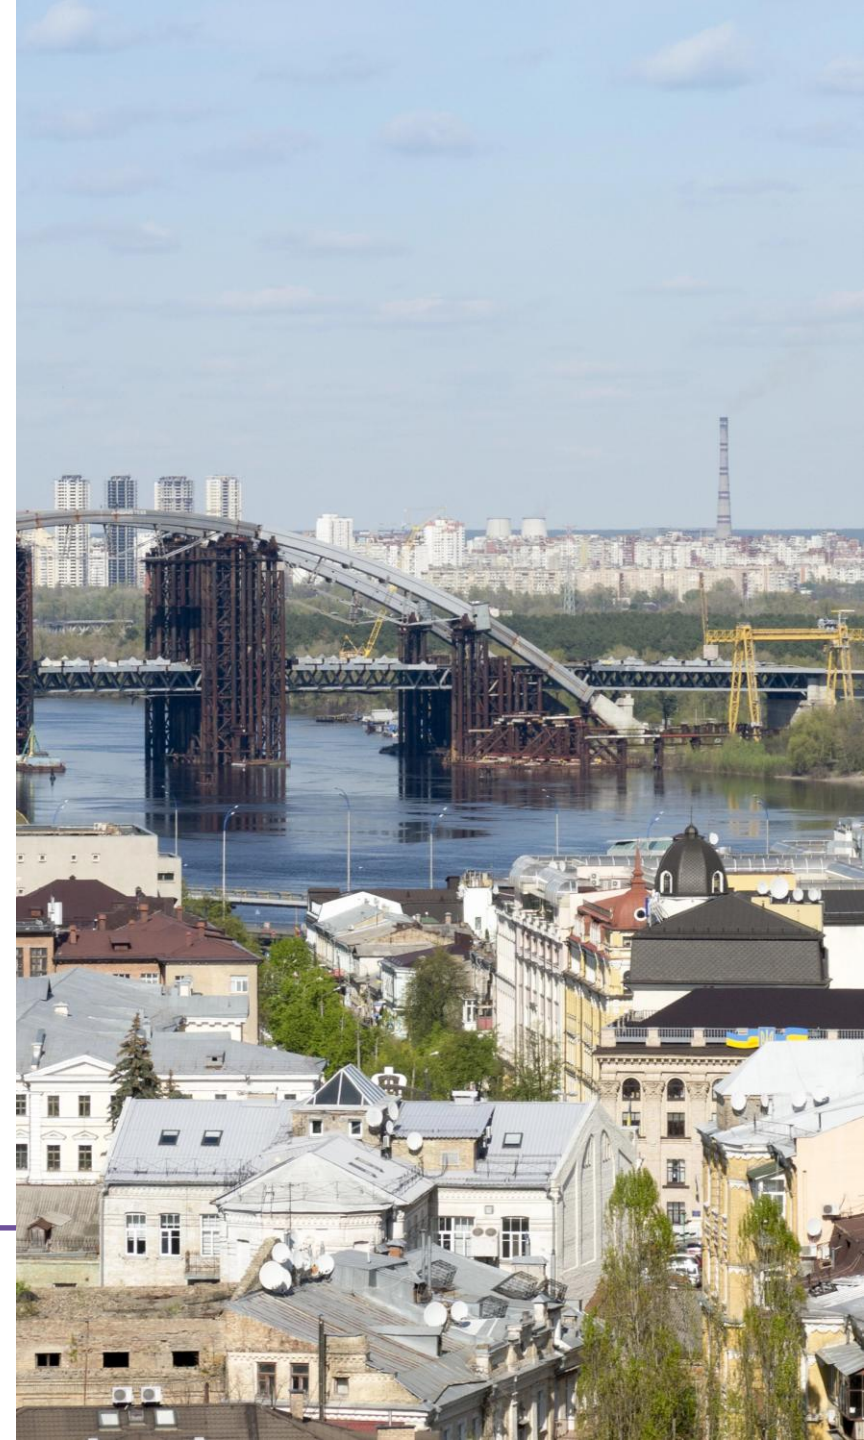

- У серпні Уряд оновив ключову постанову про управління публічними інвестиціями: спростив і уточнив підготовку, оцінку та коригування проєктів, а оцінку можливості залучення ППП інтегрував у загальний інвестиційний процес.
- Реформа починає переходити від правил до фінансування проєктів громад. Уряд спрямував 4,9 млрд грн позики ЄІБ до спецфонду держбюджету, розподілив громадам ще 1 млрд грн за іншою програмою ЄІБ та готує фінансування з ДФРР – це все фінансування для реалізації публічних інвестиційних проєктів. Однак кошти надходять наприкінці року, що створює ризик невчасного або неефективного виконання робіт.
- Уряд спростив процедуру аналізу цін у будівництві за публічні кошти, зосередивши детальну перевірку на основних ціноутворюючих матеріалах та передбачивши поетапний перехід до використання Баз даних цін у ЄДЕССБ.
- На рівні громад активність у DREAM у серпні знизилася: зареєстровано 300 нових ПІПів проти 704 у липні, переважно в освіті (141) та муніципальній інфраструктурі і послугах (77) — разом майже 73% усіх нових проєктів. Орієнтовна вартість нових ПІПів становила 11,6 млрд грн, очікуване фінансування скоротилося до 2,3 млрд грн, а отримане — до 0,4 млрд грн.
- У липні 2026 року сума будівельних закупівель була близькою до рівня липня минулого року (на 7% більша), а кількість була на 12% меншою. Будівельні закупівлі з використанням електронної системи переважали за сумою у липні.
- Основні закупівлі липня – ремонти автомобільних доріг, а також реконструкції об’єктів. Київська, Дніпропетровська та Харківська області – серед лідерів за кількістю проведених будівельних закупівель. Найменша кількість будівельних закупівель у Херсонській області.


Зміст

Новини реформи системи управління публічними інвестиціями

Оновлення ЄПП на DREAM

Аналіз закупівель відбудови

Додатки

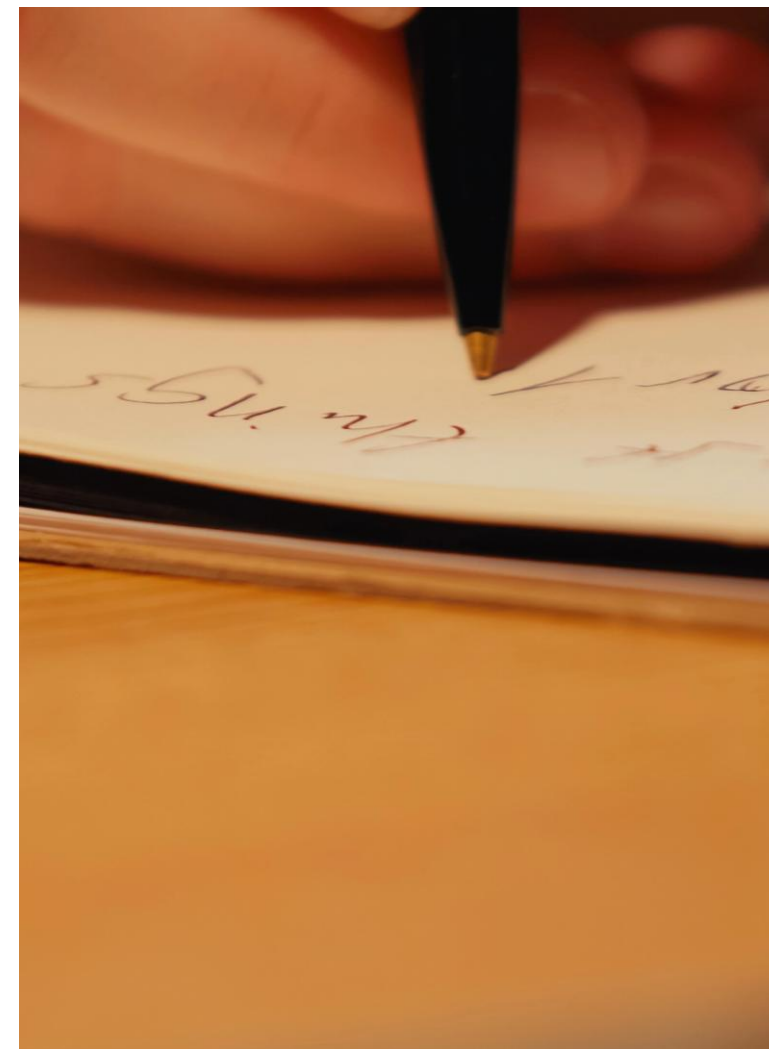

Перелік аббревіатур

ДП – Державне підприємство

ДФРР – Державний фонд регіонального розвитку

ГРК – Головний розпорядник коштів

ЄДЕССБ – Єдина державна система у сфері будівництва

ЄПП – Єдиний проєктний портфель

МФО – Міжнародні фінансові організації

ПІ – Публічні інвестиції

ПІП – Публічний інвестиційний проєкт

ПКД – Проєктно-кошторисна документація

РПЗМ – Реєстр пошкодженого та знищеного майна

СПІ – Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій


ТЕО – Техніко-економічне обґрунтування

УПІ – Управління публічними інвестиціями



Фінансується
Європейським Союзом

Новини реформи системи управління публічними інвестиціями

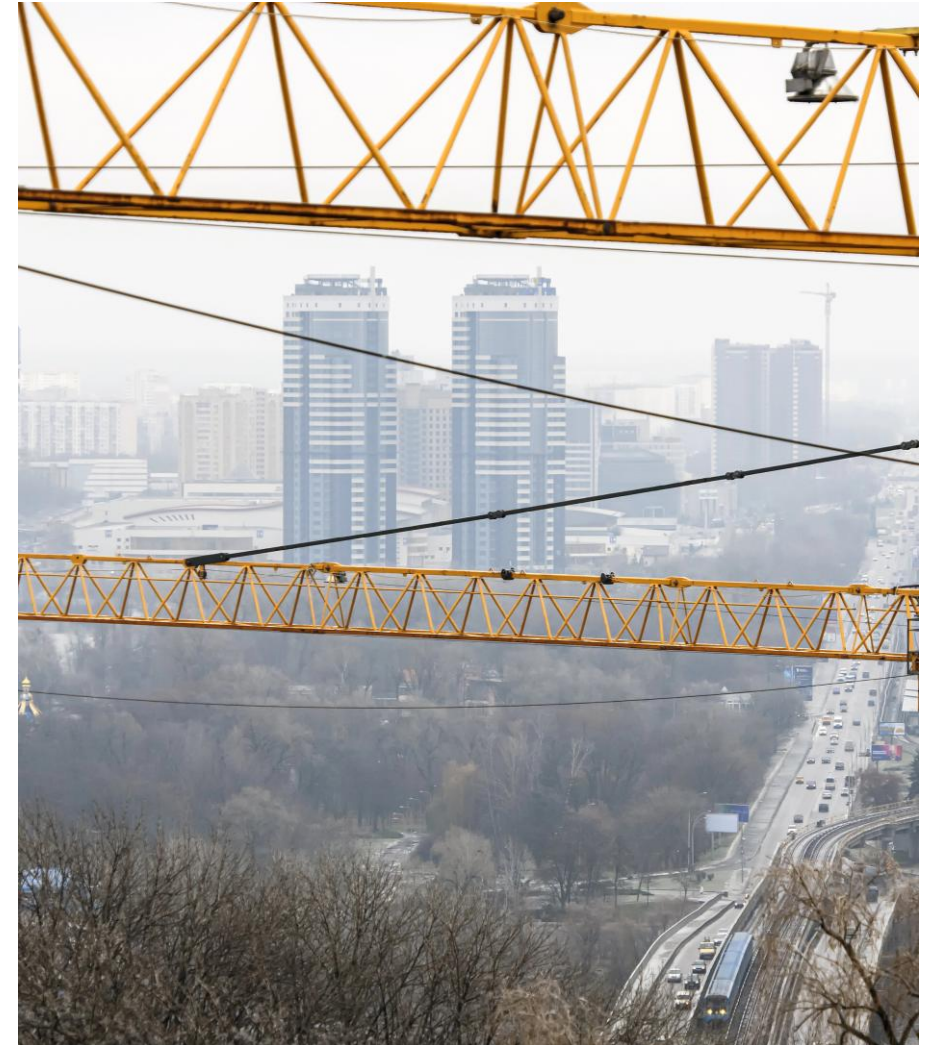

Уряд оновив ключові правила управління публічними інвестиціями



13 серпня Кабмін ухвалив постанову №1051, яка комплексно змінила постанову №527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями».

- Уточнено вимоги до підготовки попереднього та повного інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, галузевої та експертної оцінки, а також визначення готовності проєкту до реалізації.
- Запроваджено можливість коригувати проєкти протягом їхнього життєвого циклу. У разі суттєвих змін проєкт має пройти повторну оцінку.
- ЄПП держави, регіонів і громад дозволено актуалізувати протягом життєвого циклу проєктів.
- Чіткіше розмежовано ролі та відповідальність учасників підготовки й реалізації публічних інвестицій.
- Посилено вимоги до планування, моніторингу та оцінки результатів.
- Передбачено обмеження на оприлюднення чутливої інформації щодо критичної інфраструктури, кібербезпеки та національної безпеки.
- У 2026 році громади та регіони отримали можливість включати до ЄПП проєкти з уже підтвердженим фінансуванням і самостійно визначати напрями інвестування відповідно до стратегічних документів.

Чому це важливо для УПІ. Постанова переходить від одноразового відбору проєктів до управління ними протягом усього життєвого циклу – від формування ідеї до реалізації, моніторингу та коригування.

Виклик. Частину технічних рішень у DREAM мають запровадити лише протягом шести місяців.

Публічно-приватне партнерство інтегрували в систему публічних інвестицій



Постанова №1051 також встановила нові правила підготовки та оцінки проєктів публічно-приватного партнерства (ППП) і концесій.

Основні зміни :

- Затверджено порядки аналізу концептуальної записки та ефективності проєктів ППП.
- Для проєктів вартістю до 5,5 млн євро передбачено спрощений порядок підготовки.
- Під час оцінки публічного інвестиційного проєкту має визначатися можливість і доцільність залучення приватного партнера.
- Ідентифікацію потенціалу ППП потрібно провести також для частини проєктів, оцінювання яких розпочалося до набрання чинності постановою.
- Для ППП застосовуватимуться спільні з іншими публічними інвестиціями принципи планування, оцінки, пріоритезації та відбору.
- Необхідний функціонал DREAM для проєктів ППП і концесій має бути впроваджений до 1 квітня 2027 року.

Що це змінює. ППП більше не розглядається як відокремлений механізм фінансування ПІП. Тепер можливість залучення приватного капіталу має оцінюватися ще під час підготовки публічного інвестиційного проєкту. Зокрема це пов'язано з тим, що наявного бюджетного фінансування недостатньо.

Виклик. Саме включення оцінки ППП до процедури не гарантує появи життєздатних партнерств. Потрібні якісні фінансові моделі, оцінка ризиків і достатня спроможність замовників управляти довгостроковими контрактами.

Уряд спростив аналіз цін у будівництві за публічні кошти



Уряд оновив постанову №1512, яка регулює аналіз цін на будівельні матеріали у проєктах, що фінансуються за публічні кошти, кошти державних і комунальних підприємств та міжнародні ресурси.

Основні зміни :

- Для об'єктів вартістю до 1,5 млн грн замовник самостійно визначатиме порядок аналізу цін і зберігатиме відповідний документ без завантаження до Баз даних цін у ЄДЕССБ. Для більших проєктів детальність аналізу залежатиме від впливу матеріалу на загальну вартість будівництва. Запроваджується принцип 60/30/10:
 - Найбільш використовувані категорії матеріалів, що становлять 60% вартості усіх матеріалів — детальний аналіз на підставі щонайменше трьох цінових пропозицій;
 - Матеріали, що входять у наступні 30% вартості — спрощений аналіз із використанням ширшого переліку джерел;
 - Найменш вживані матеріали, що входять у останні 10% — інформація з будь-яких незаборонених джерел.
- Аналіз цін можна доручати стороннім фахівцям або спеціалізованим організаціям.
- Публічні ціни на сайтах виробників і постачальників, електронні цінові пропозиції та інформація з Баз даних цін визнаються належними джерелами.
- Для проєктів, реалізація яких уже розпочалася, передбачено перехідні правила, щоб нові вимоги до електронних звітів не спричинили зупинення робіт або повторної експертизи.

Що це змінює. Аналіз цін має зосередитися на матеріалах, які найбільше впливають на кошторис, замість однаково детальної перевірки тисяч позицій. Для громад це означає менше адміністративного навантаження під час реалізації невеликих проєктів.

Виклик. Нова модель залежатиме від наповненості та репрезентативності Баз даних цін. База має бути ринковим орієнтиром, а не інструментом адміністративного встановлення цін.

У серпні завершилося подання проєктів на фінансування з ДФРР



У серпні громади та регіони подавали середньострокові плани і пріоритетні проєкти для фінансування з ДФРР, бюджет якого у 2026 році становить 2 млрд грн.

Основні зміни:

- До 3 серпня громади подавали обласним адміністраціям СПІ зі списком пріоритетних ПІП, які входять в ЄПП (не більше 5).
- Обласні адміністрації мали перевірити документи та передати їх Мінрозвитку до 13 серпня.
- Проєкти мають відповідати ДСРР, стосуватись об'єктів комунальної власності та бути реалізовані до кінця 2026 року.
- 30% ДФРР спрямовується на проєкти, які покликані виконувати завдання Державної стратегії регіонального розвитку, 70% - на завдання регіональних стратегій і стратегій громад. За напрямом, на який спрямовується 70% фонду, не фінансуються об'єкти культури, дорожньо-транспортна інфраструктура та житлові об'єкти.
- Практичною перевагою користуються готові до реалізації проєкти, які можна завершити протягом поточного бюджетного року
- Гроші розподіляються поки що не через DREAM. Також уряд напрацьовує зміни щодо ДФРР на майбутнє.

Що це змінює. Нарешті триває розподіл коштів ДФРР, яке очікували раніше. Отже, принаймні частина ПІП громад буде профінансована до кінця року.

Виклик. Фактичне виділення коштів ще потребуватиме часу, а тому знову традиційним викликом буде встигнути завершити реалізацію ПІП до кінця 2026 року.

Уряд спрямував 4,9 млрд грн на Програму відновлення України III



19 серпня Уряд спрямував до спеціального фонду державного бюджету кошти позики ЄІБ за Траншем В Програми відновлення України III

Основне:

- Обсяг спрямованих коштів становить 4,9 млрд грн.
- Фінансування призначене насамперед для громад, які постраждали від бойових дій або прийняли значну кількість ВПО.
- Основні напрями визначено модернізація водопостачання, відновлення шкіл і лікарень, а також соціальне житло.
- Проекти для програми мають бути подані на DREAM та пройти пріоритизацію. Після розгляду Експертною робочою групою перелік проектів має бути погоджений ЄІБ.
- Розпорядження про спрямування 4,9 млрд грн не містить розподілу коштів між конкретними місцевими бюджетами та проектами, оскільки це буде здійснено після відбору.

Що це змінює. Рішення забезпечує бюджетний ресурс для фінансування проектів за Траншем В. Наступними кроками мають стати остаточне погодження переліку проектів ЄІБ та розподіл субвенції між місцевими бюджетами.

Виклик. Розподіл коштів відбувся досить пізно. Якщо навіть гроші буде виділено на відібрані проекти цього року, то їх буде складно завершити до кінця року.

Додатковий 1 млрд грн уже розподілено між громадами



27 серпня Уряд розподілив між громадами додаткове фінансування за окремою фінансовою угодою «Програмою з відновлення України» (ЄІБ).

Основне:

- Ще 15 липня фінансування програми у 2026 році було збільшено на 1 млрд грн.
- У серпні додатковий ресурс розподілили між громадами 16 областей на фінансування відібраних раніше проєктів.
- Загальний обсяг фінансування програми у 2026 році зріс із 987,1 млн грн до майже 2 млрд грн.
- Кошти дозволять продовжити реалізацію чинних проєктів і профінансувати 25 нових проєктів, уже погоджених ЄІБ.
- Загальна кількість погоджених проєктів збільшується зі 138 до 163.
- Під час розподілу враховували готовність проєктів: наявність актуальної документації та угоди про передачу коштів позики, стан закупівель та інші умови.
- Після розподілу кошти мають бути перераховані місцевим бюджетам у формі субвенції.
- Фінансування на проєкти за Програмою поки що розподіляються поза межами DREAM.

Що це змінює. Визначено громади та погоджені проєкти, на які спрямовується фінансування. Це дозволяє переходити до укладання угод, проведення закупівель і виконання робіт..

Виклик. Розподіл коштів відбувся пізно. Ризик не встигнути вчасно виконати роботи досить високий.



Фінансується
Європейським Союзом

Оновлення ЄПП на DREAM



Громади у серпні додали ПІПи переважно в освіті та муніципальній інфраструктурі



У серпні* на платформі DREAM зареєстрували 300 нових ПІПів.

141 – нові проекти стосуються освіти, ще 77 – муніципальної інфраструктури та послуг, що разом становлять майже 73% усіх нових ПІПів громад у липні. Це, найвірогідніше пов’язано з наявністю виділеного фінансування, особливо в освіті.

Сектор	Всього станом на кінець липня	Зареєстровано у серпні*
Аграрний	17	0
Громадська безпека	462	6
Довкілля	131	0
Економічна діяльність	42	0
Енергетика	278	5
Житло	604	17
Культура та інформація	461	3
Муніципальна інфраструктура та послуги	3934	77
Освіта і наука	6526	141
Охорона здоров’я	1651	17
Соціальна сфера	503	9
Юстиція	1	0
Транспорт та послуги поштового зв’язку	833	21
Цифрова трансформація держави та суспільства	153	2
Спорт, фізичне та молодіжне виховання	263	2
Загальний підсумок	15859	300

Примітка: ЄПП – єдиний проектний портфель
ПІП – публічний інвестиційний проект
Рівень громад – ініціатором проекту є територіальні громади

* Вересень 2025 року - серпень 2026 року, Станом на 1 вересня 2026 року
3 вересня 2025 року DREAM представляє національні, регіональні та місцеві СПІ та ЄПП, всі попередні проекти можна знайти в [архіві DREAM](#) [brp.org.ua](#)
Джерело: DREAM

Серпневе падіння показників: скорочення кількості нових ППів, очікуваного та отриманого фінансування на рівні громад



Місяць	Кількість ППів, од.	Отримане фінансування, млрд грн.	Очікуване фінансування, млрд грн.	Орієнтовна вартість, млрд грн.
Квітень	1283	0,9	5,6	48,5
Травень	573	0,6	2,0	26,0
Червень	544	0,3	6,5	27,5
Липень	704	3,2	47,2	47,4
Серпень	300	0,4	2,3	11,6
Всього в DREAM*	16159	41,3	210,4	1,2 трлн

У серпні* громади зареєстрували 300 ППів проти 704 у липні. Очікуване фінансування становило лише 2,3 млрд грн (з них 604 млн грн. – Капітальний ремонт тротуару у Миколаєві, а також майже 362 млн. грн – модернізація системи водовідведення в м. Надвірна Івано-Франківської області), отримане — 0,4 млрд грн. При цьому орієнтовна вартість нових проєктів склала 11,6 млрд грн.

Примітка: ЄПП – єдиний проєктний портфель
ПП – публічний інвестиційний проєкт

* Вересень 2025 року - серпень 2026 року, Станом на 1 вересня 2026 року
З вересня 2025 року DREAM представляє національні, регіональні та місцеві СПІ та ЄПП, всі попередні проєкти можна знайти в [архіві DREAM](#)
Джерело: DREAM brp.org.ua

На регіональному рівні серпневий приріст сформували переважно проекти з охорони здоров'я та освіти



У серпні на регіональному рівні зареєстрували 86 нових ПІПів.
Більшість з них – охорона здоров'я: 50 проєктів, ще 15 ПІПів – освіта.

Сектор	Всього станом на кінець липня	Зареєстровано у серпні*
Аграрний	16	0
Громадська безпека	207	1
Довкілля	52	0
Енергетика	83	1
Житло	961	7
Культура та інформація	207	4
Муніципальна інфраструктура та послуги	232	2
Освіта і наука	1518	15
Охорона здоров'я	615	50
Протимінна діяльність	1	0
Публічні фінанси	4	0
Соціальна сфера	276	2
Юстиція	1	0
Транспорт та послуги поштового зв'язку	311	2
Цифрова трансформація держави та суспільства	31	2
Спорт, фізичне та молодіжне виховання	77	0
Загальний підсумок	4592	86

Примітка: ЄПП – єдиний проєктний портфель
ПІП – публічний інвестиційний проєкт
Рівень регіону– ініціатором проєкту є ОДА чи КМДА

* Вересень 2025 року - серпень 2026 року, Станом на 1 вересня 2026 року
З вересня 2025 року DREAM представляє національні, регіональні та місцеві СПІ та ЄПП, всі попередні проєкти можна знайти в [apxibi DREAM](#) [brp.org.ua](#)
Джерело: DREAM

Проектів на регіональному рівні менше, отримане фінансування – зросло



Місяць	Кількість ППів, од.	Отримане фінансування, млрд грн.	Очікуване фінансування, млрд грн.	Орієнтовна вартість, млрд грн.
Квітень	577	7,2	9,8	96,4
Травень	757	0,7	23,2	95,5
Червень	517	0,5	2,1	13,3
Липень	272	0,3	2,5	14,0
Серпень	86	0,4	1,5	3,0
Всього*	4678	19,0	64,9	3,8 трлн

У серпні кількість нових ППів і фінансові показники були суттєво нижчими, ніж у липні.
Орієнтовна вартість проектів липня була майже вп'ятеро нижчою, ніж у липні.
У серпні найдорожчими регіональними ПП було зареєстровано реконструкцію приміщень кардіологічного корпусу (м. Запоріжжя, 900 млн грн.) і реконструкцію Київської міської дитячої клінічної лікарні №2 (м. Київ, 212 млн грн.).


Примітка: ЄПП – єдиний проектний портфель
ПП – публічний інвестиційний проект

* Вересень 2025 року - серпень 2026 року, Станом на 1 вересня 2026 року
З вересня 2025 року DREAM представляє національні, регіональні та місцеві
СПІ та ЄПП, всі попередні проекти можна знайти в [архіві DREAM](#)
Джерело: DREAM brp.org.ua



Фінансується
Європейським Союзом

Закупівлі відбудови станом на липень 2026 року*

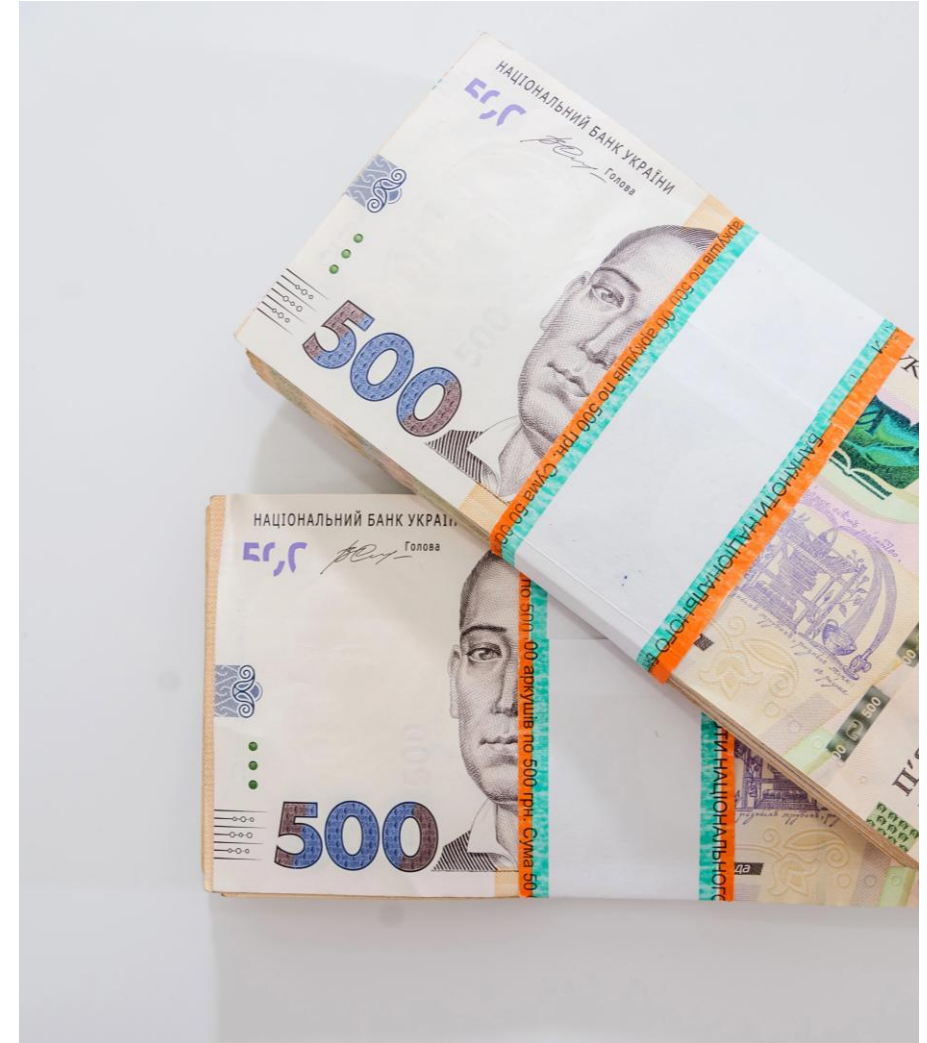


*оперативні дані можуть бути уточнені

brp.org.ua

У липні кількість і сума будівельних закупівель* були близькими до минулорічних значень



- Переважна більшість з оголошених у липні 2026 року закупівель уже завершені — таких 13 тис. (90%). Ще триває 1%, не відбулися 7%, скасовані 2%.
- Кількість закупівель у липні 2026 менша ніж у липні минулого року на 12%, а сума – більша на 7% р/р.
- Найбільшим організатором закупівель у липні є Департамент капітального будівництва Харківської ОДА на суму 3,2 млрд грн, зокрема з метою будівництва свердловин для питної води.

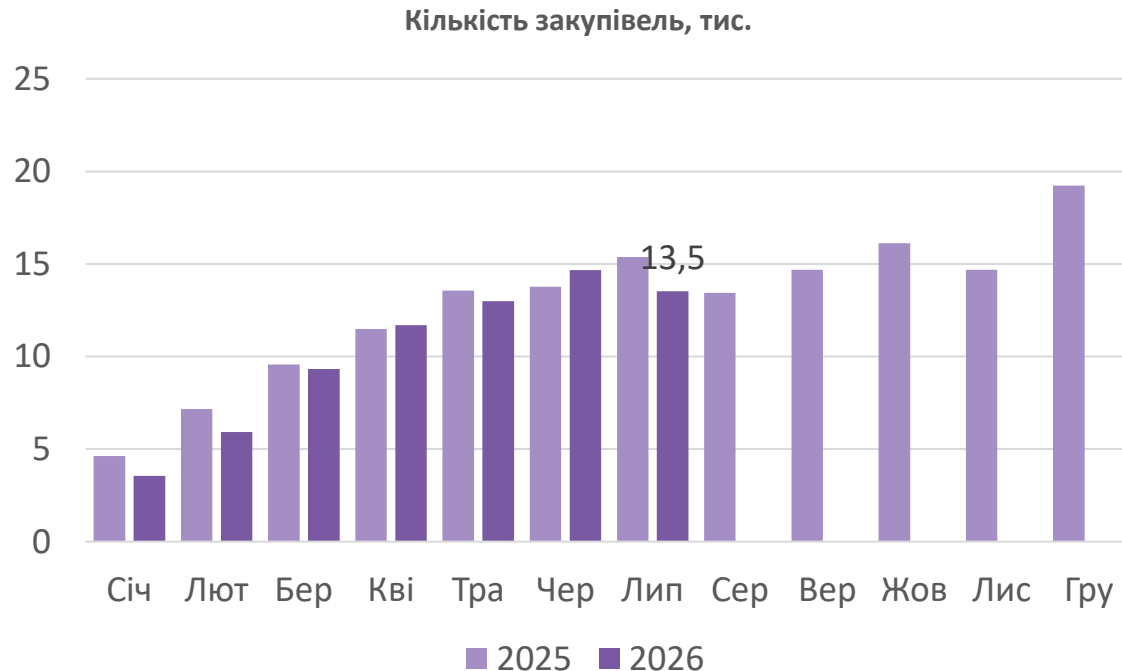

Найбільші організатори відповідальні за половину завершених будівельних забудівель* у липні



Топ-10 організаторів (млрд грн)

1.	Департамент капітального будівництва Харківської ОДА	3,2
2.	КП «Київтеплоенерго»	2,4
3.	Департамент регіонального розвитку Київської ОДА	0,9
4.	ДП «Місцеві дороги Запорізької області»	0,9
5.	КП «Водоканал»	0,8
6.	КП «Харківські теплові мережі»	0,6
7.	Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області	0,5
8.	ДП «Дороги Харківщини»	0,4
9.	КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради	0,3
10.	КП «Вінницяміськтеплоенерго» Вінницької міської ради	0,3

Частка топ-10 у всіх закупівлях



Топ-10 переможців (млрд грн)

1.	ТОВ «Слобожанська будівельна компанія Саргон»	1,7
2.	Консорціум «Білдінг Груп»	1,2
3.	ТОВ «Автомагістраль-Південь»	1,0
4.	ТОВ «Алд Інжиніринг та Будівництво»	0,8
5.	ТОВ «Ла-Круа»	0,7
6.	ТОВ Будівельно-монтажне управління №460	0,7
7.	ТОВ «Будівельна компанія «Кальміус»	0,6
8.	ТОВ «Група компанія «Автострада»	0,6
9.	ТОВ «ІБК «Атмосфера Менеджмент»	0,5
10.	ТОВ «Укрбуд-Проект-Реконструкція»	0,3

Частка топ-10 у всіх закупівлях




Енергетика, водопостачання та дороги – лідери закупівель* у липні



№	Зміст закупівлі	Організатор	Переможець	Вартість закупівлі, млрд грн
1	Нове будівництво артезіанських свердловин для забезпечення питною водою	Департамент капітального будівництва Харківської ОДА	ТОВ «Слобожанська будівельна компанія Саргон»	1,7
2	Будівництво комплексу КНП «Обласний центр онкології», м. Харків	Департамент капітального будівництва Харківської ОДА	Консорціум «Білдінг Груп»	1,2
3	Реконструкція об'єкту КП «Київтеплоенерго» з облаштуванням фізичного захисту	КП «Київтеплоенерго»	ТОВ «Ла-Круа»	0,6
4	Будівництво перетинки для подачі струму	КП «Київтеплоенерго»	ТОВ Будівельно-монтажне управління №460	0,6
5	Будівництво перетинки для подачі струму	КП «Київтеплоенерго»	ТОВ «ІБК «Атмосфера Менеджмент»	0,5
6	Реконструкція підстанції	ДП «Місцеві дороги Запорізької області»	ТОВ «Будівельна компанія «Кальміус»	0,5
7	Поточний ремонт автомобільної дороги Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв	Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області	ТОВ «Група компанія «Автострада»	0,5
8	Нове будівництво об'єкта	ДП «Дороги Харківщини»	ТОВ «Автомагістраль-Південь»	0,4
9	Реконструкція об'єкту в м. Запоріжжі	КП «Водоканал»	ТОВ «Алд Інжиніринг та Будівництво»	0,4
10	Нове будівництво водопровідної мережі на території Бучанської громади	КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради	ТОВ «Укрбуд-Проект-Реконструкція»	0,3

У липні закупівлі* з використання електронної системи переважали за сумою, але не за кількістю

Використання електронної системи у липні 2026

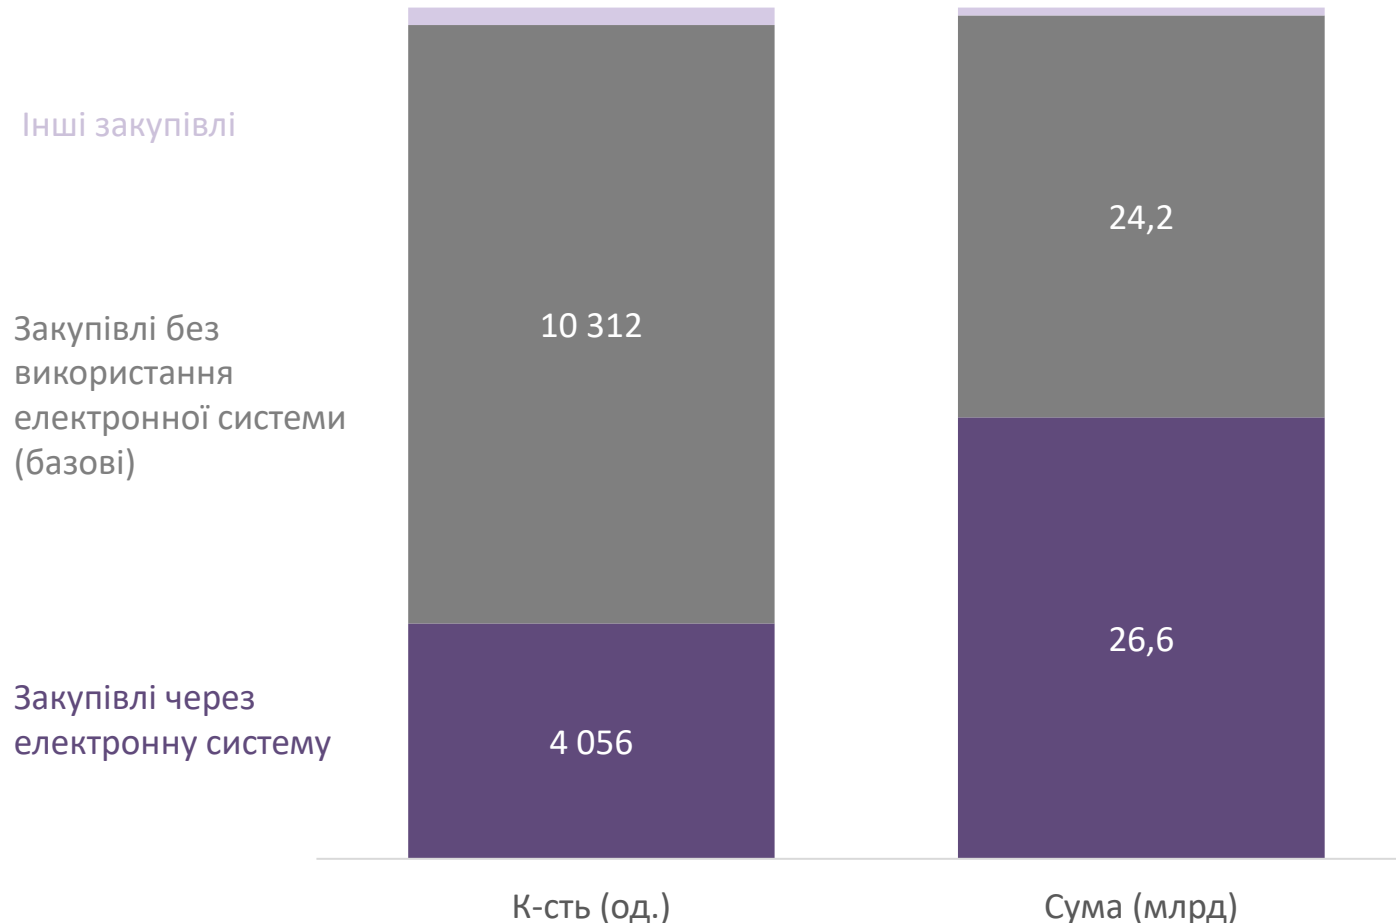


- Електронну систему використали для 4,1 тис. завершених закупівель (28% від усіх завершених) на суму 26,6 млрд грн (52% від усіх закупівель) у липні 2026 року.
- 72% завершених закупівель у липні відбулися поза електронною системою на 47% загальної суми.

Закупілі* з одним учасником переважають

- У липні частка закупівель з одним учасником залишилася на рівні попереднього місяця (99% усіх завершених закупівель на 95,9% загальної суми закупівель).
- З використанням електронної системи, частка завершених будівельних закупівель з одним учасником склала 90,8% загальної кількості на 88,9% суми (Додаток 1).
- Натомість, за січень-липень 2026 частка закупівель з одним учасником з використанням електронної системи склала 84,7% кількості закупівель на 79,3% загальної суми закупівель.
- У липні була 1 закупівля на 6 учасників (вартість закупівель знизилася на 1% порівняно з очікуваною вартістю) та 2 закупівлі на 5 учасників (вартість закупівель знизилася в середньому на 26% від очікуваної вартості).

Частка закупівель за кількістю учасників, %

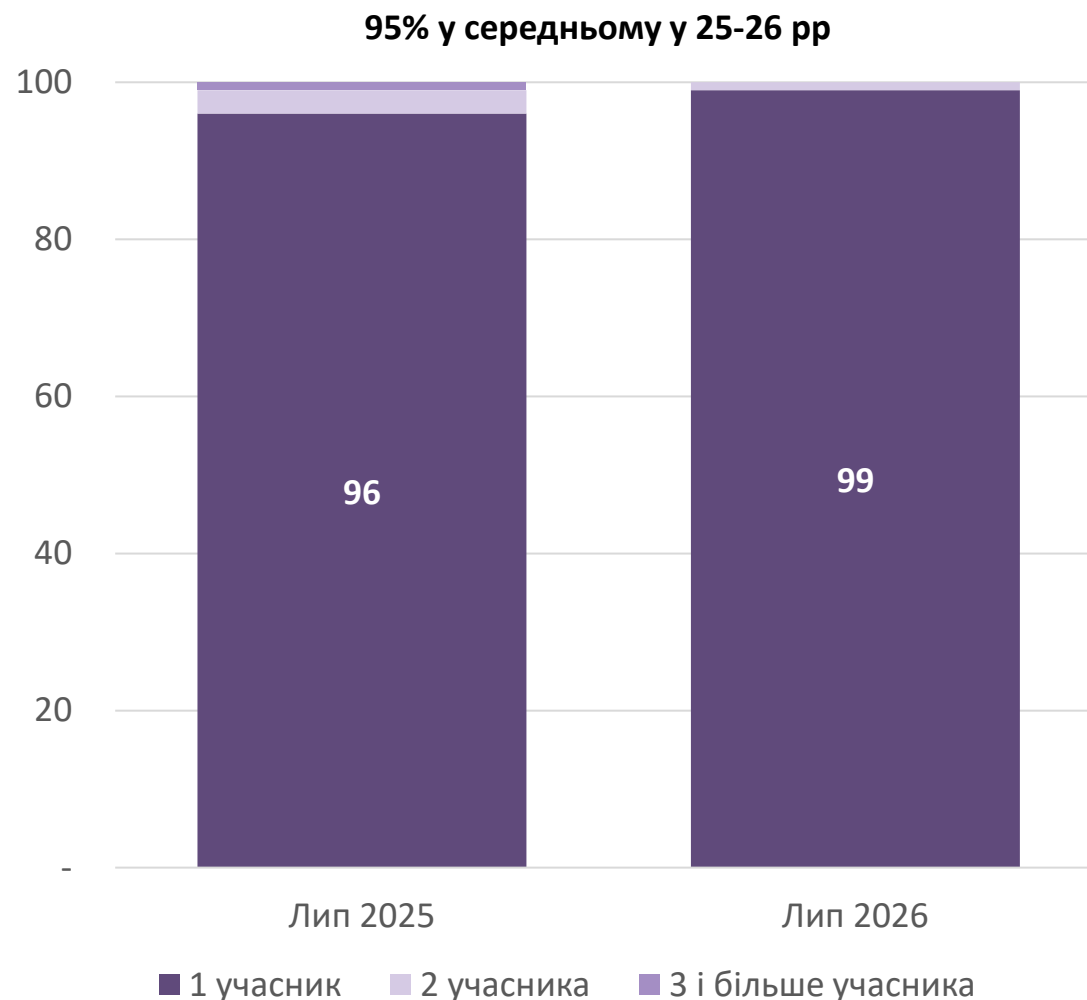


В закупівлях* з більшою кількістю учасників помітно знизилася ціна



№	Зміст закупівлі	Організатор	Переможець	Вартість, млн грн очікувана/поточна		Учасники
Усі закупівлі						
1	Послуги зі встановлення на скло вікон	КП «Облводоканал» Запорізької облради	ТОВ «Комплайт»	0,3 / 0,3	(-1%)	6
2	Поточний рахунок доріг, Білоцерківський район	Відділ ЖКГ Рокитнянської селищної ради	ТОВ «Трафік Менеджмент Груп»	0,6 / 0,4	(-29%)	5
3	Поточний ремонт будівлі Миколаївського ліцею №40	Управління освіти Миколаївської міської ради	ТОВ «Оконіка»	0,4 / 0,3	(-22%)	5
Закупівлі на суму більше 20 млн грн						
1	Будівництво майданчика свердловини № 154	АТ «Укрнафта»	ТОВ «Нафтогазбуріння»	35,8 / 32,0	(-11%)	4
2	Нове будівництво водопровідної мережі на території Бучанської громади	КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради	ТОВ «Укрбуд-Проект-Реконструкція»	380,5 / 323,6	(-15%)	3
3	Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Полтавської тергромади	УЖКГ Полтавської міської ради	ТОВ «Автошлях 2020»	34,6 / 30,2	(-13%)	3

Більшість закупівель* проходить дуже швидко — до 3 днів

Частка будівельних закупівель за тривалістю

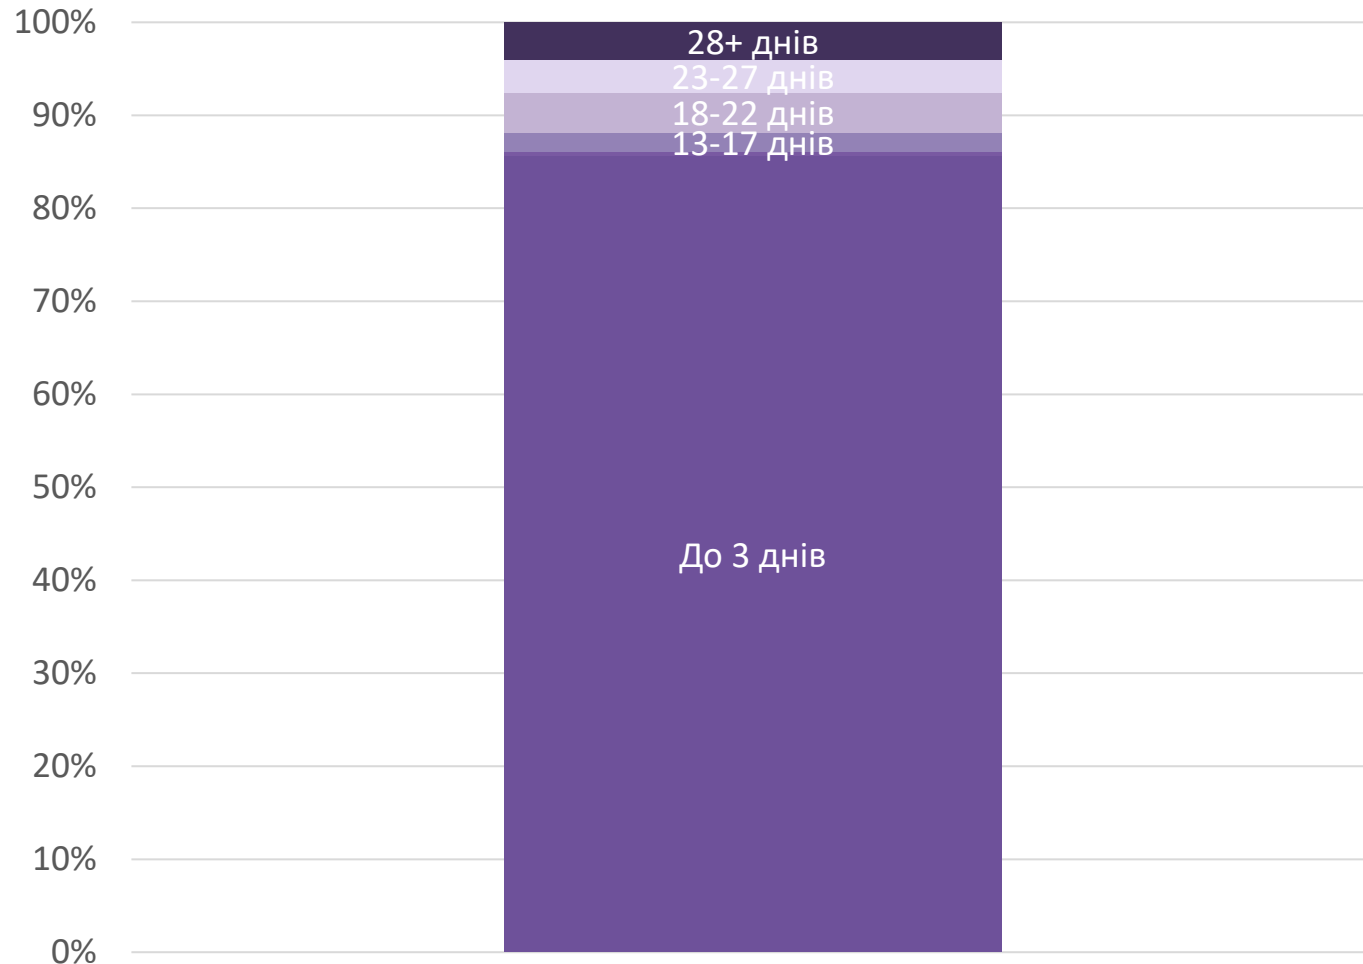

Джерело: [Bi Prozorro](https://bi.prozorro.org.ua)

- У липні близько 86% тендерів тривали до 3 днів. При цьому, 92% тривали до 22 днів.
- За 2026 рік частка тендерів з тривалістю менше 3 днів становила 81%, а за період 2023-2026 – 83%.
- В порівнянні з темпами проходження тендерів у червні, липень 2026 віддалився від середніх показників (за рахунок збільшення частки тендерів, що тривають до 3 днів, на 3 в.п.).
- Частка тендерів з тривалістю понад 28 днів у липні залишилася на рівні 4%, як і у червні.

*закупівлі на будівельні роботи та поточний ремонт


brp.org.ua

Закупівлі* у сконцентровані у найбільших областях, особливо в Києві та Київській області



- Найбільша кількість завершених будівельних закупівель у липні відбувалася в Київській, Львівській та Дніпропетровській областях. Закупівлі в цих областях становили 36% усіх будівельних закупівель. Найменша кількість – у Херсонській та Луганській областях.
- Майже половина усіх будівельних закупівель на Півдні відбувалися в Одесі, а 70% закупівель на Півночі – у Київській області та Києві.
- При цьому, 22% усіх закупівель організовувалися у Київській області та м. Києві. Серед найбільших будівельних закупівель Києва – реконструкція КП «Київтеплоенерго».
- Дві найбільші будівельні закупівлі липня були організовані Департаментом капітального будівництва Харківської ОДА. Загалом майже 6% усіх закупівель були організовані у Харківській області.

Кількість будівельних закупівель за макрорегіонами, тис.

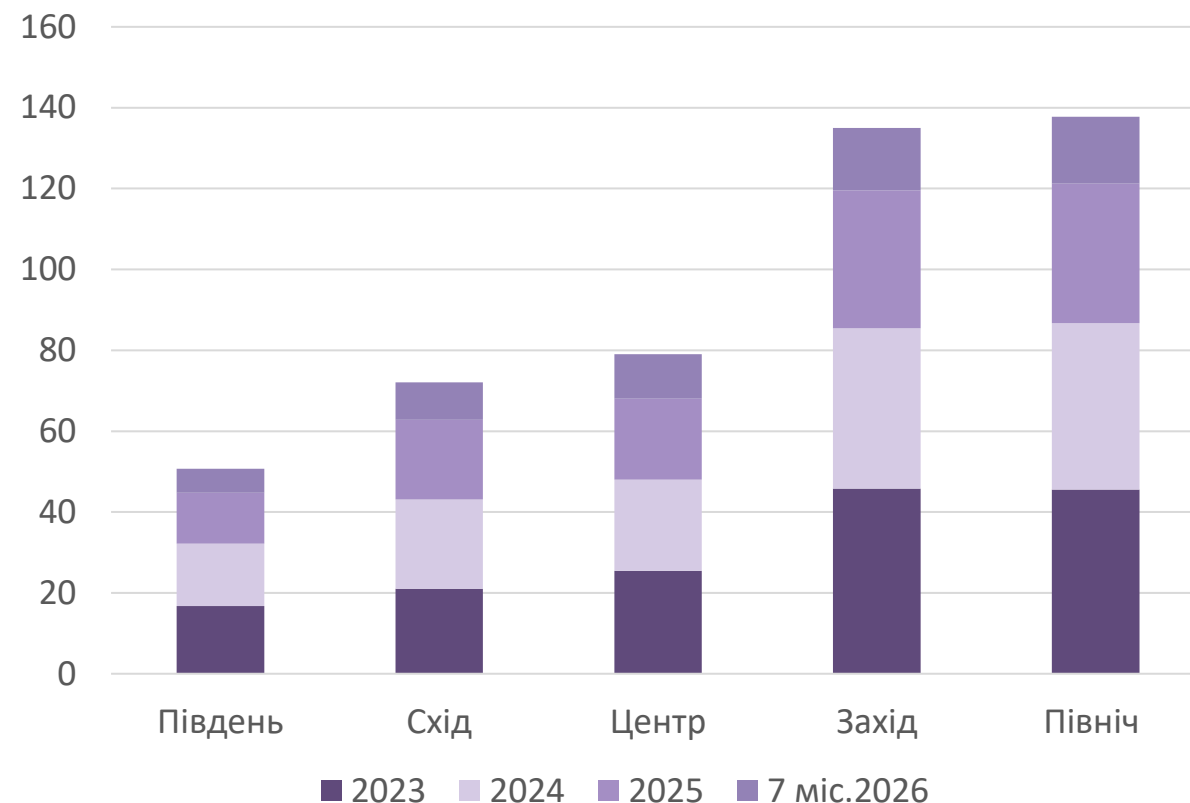

** Південь: АР Крим, Запорізька, Миколаївська, Одеська та Херсонська області
Північ: Житомирська, Київська та м. Київ, Сумська, Чернігівська області
Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області
Схід: Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Харківська області
Центр: Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська області



Фінансується
Європейським Союзом

Додатки

Додаток 1. Закупівлі* з використанням електронної системи

К-ть учасників	К-ть і % закупівель у січні-липні		Сума (млрд) і % закупівель у січні-липні		К-ть і % закупівель у липні		Сума (млрд) і % закупівель у липні	
1 учасник	10 216	84,7	108,8	79,3	1 326	90,8	6,1	88,9
2 учасники	1 276	10,6	21,4	15,6	98	6,7	0,3	4,9
3 учасники	339	2,8	5,1	3,7	30	0,2	0,4	5,7
4 учасники	136	1,1	0,9	0,7	3	0,0	0,0	0,5
5 учасників	57	0,5	0,9	0,6	2	0,0	0,0	0,0
6 учасників	20	0,2	0,1	0,1	1	0,0	0,0	0,0
7-17 учасників	23	0,2	0,1	0,1	0	0,0	0,0	0,0
Разом завершених закупівель з використанням електронної системи	12 067	100,0	137,2	100,0	1 460	100,0	6,9	100,0



Дякуємо за увагу!

Проект «Контроль публічних інвестицій»



brp.org.ua
